



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 295/2013	del	07/10/2013
-------------	-----	------------

OGGETTO	ALLESTIMENTO DEI PERCORSI CICLOPEDONALI "IAZZO ROSSO - SAN MAGNO - CASTEL DEL MONTE"- APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA DI VARIANTE SUPPLETTIVA E DI ASSESTAMENTO FINALE
----------------	---

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la relativa disponibilità finanziaria sul Bilancio di riferimento.

La spesa prevista con il presente atto trova copertura finanziaria sul Cap. _____ - UPB _____ del Bilancio di Previsione 2014.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di € _____ UPB _____ Cap. _____ Esercizio _____ in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno _____ assunto con <input type="checkbox"/> deliberazione <input type="checkbox"/> determinazione n. _____ del _____
2) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di € _____ UPB _____ Cap. _____ Esercizio _____ in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno _____ assunto con <input type="checkbox"/> deliberazione <input type="checkbox"/> determinazione n. _____ del _____



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

IL DIRETTORE F.F.

PREMESSO CHE:

- con propria determinazione n. 274 del 18/10/2011 é stato approvato il progetto esecutivo per l'allestimento dei percorsi ciclopedonali "Iazzo Rosso-San Magno - Castel del Monte", ammesso a finanziamento nell'ambito del PO FESR Puglia 2007-2013. Asse IV, Linea 4.4. -"Avviso pubblico per primi interventi per lo sviluppo di percorsi di fruizione del territorio naturale anche attraverso forme che favoriscono intermodalità (percorsi ciclovie) tra aree urbane" riportante il seguente quadro economico:

A. Importo complessivo dei Lavori

A.1 Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	€	266.928,85
A.2 Importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza	€	14.000,00
Sommano	€	280.928,85

B. Somme a disposizione della Stazione appaltante:

B.1 Imprevisti	€	8.000,00
B.2 Incentivo di cui all'art. 92 DLGS 163/2006	€	5.618,58
B.3 Accantonamento di cui all'art. 133 c. 4 e 7 DLGS 163/2006	€	3.346,44
B.4 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	€	27.800,00
B.5 CNAP 2%	€	606,00
B.6 Eventuali spese per Commissioni giudicatrici	€	500,00
B.7 Spese per pubblicità, bandi e gare	€	3.039,32
B.8 Spese per collaudo tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi	€	2.000,00
B.8 IVA 21%	€	68.160,81
Sommano	€	119.071,15
Totale al netto degli oneri della sicurezza	€	386.000,00
TOTALE GENERALE	€	400.000,00

CONSIDERATO che con determinazione n. 140 del 16/05/2012 veniva aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori relativi all'allestimento dei percorsi ciclopedonali "Iazzo Rosso - San Magno - Castel del Monte" al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese CO.LE.FOR. di Puzifferri e Squeo (mandataria) con sede in Gravina in Puglia alla Via Colangelo, 9 e TRAFFIC Service S.r.l. (mandante) con sede in Spinazzola alla Via G. Bovio, 17, per un importo dei lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 25,41%, pari ad € 199.102,19, oltre €14.000,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza ed IVA 10% e si approvava altresì il nuovo quadro economico così determinato:

A. Importo complessivo dei Lavori

A.1 Importo dei lavori al netto del ribasso del 25,41%	€	199.102,19
A.2 Importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza	€	14.000,00
Sommano	€	213.102,19

B) Somme a disposizione della Stazione appaltante:

B.1 Imprevisti e lavori in economia 10% di A.1	€	19.910,22
B.2 Incentivo di cui all'art. 92 DLGS 163/2006, 2%	€	5.338,58
B.4 Spese tecniche relative a:		



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti

B.5 CNAP 4% su B.4 + B.7	€	27.800,00
B.6 Spese per pubblicità, bandi, gare, e commissioni giudicatrici	€	1.212,00
B.7 Spese per collaudo tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi	€	2.000,00
B.8 IVA 10% su A	€	2.500,00
B.9 IVA 21% su B4 + B.5 + B.7	€	21.310,22
Sommario	€	6.617,52
Totale al netto degli oneri della sicurezza	€	86.688,54
TOTALE GENERALE	€	285.790,73
	€	299.790,73

VISTO il contratto d'appalto sottoscritto il 02/07/2012 e registrato ad Altamura il 05/07/2012 al n. 6565 serie 3;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori sono sopraggiunte nuove circostanze, inquadrabili nella casistica prevista dall'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., tali da indurre la Direzione dei Lavori a ravvisare la necessità di redigere una variante ai lavori, le cui cause sono state accertate dal RUP con un'apposita relazione, variante che ha portato ad un nuovo importo contrattuale di € 240.666,94 di cui € 15.811,34 per oneri della sicurezza, comportando un aumento netto per i lavori di € € 25.753,38 ed un aumento per oneri della sicurezza di € 1.811,34 oltre IVA 10%, con un'incidenza pari al 12,93% sul contratto principale, e quindi nei limiti del quinto, così come previsto dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che il Dlg 163/2006 e s.m.i. all'art. 132 prevede che le varianti in corso d'opera possono essere ammesse per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento e che in particolare la necessità di apportare la variante si è resa necessaria per le seguenti motivazioni:

1) *Riconducibili all'art. 132 c.1, lett. b) del D. Lgs 163/2006 :*

- Dopo l'approvazione del progetto esecutivo la Provincia di Bari, Servizio Viabilità, ed i Comandi della Polizia Locale dei Comuni di Corato e Ruvo di Puglia, hanno chiesto di apportare modifiche alla tipologia ed alla quantità della segnaletica verticale da apporre lungo le strade di loro gestione, al fine di risolvere interferenze con i propri piani " del traffico", con una conseguente costo in diminuzione dei lavori di € 18.683,74, a lordo del ribasso d'asta.

2) *Riconducibili all'art. 132 c.1, lett. c) del D. Lgs 163/2006 :*

- In corso d'opera si è rilevata la necessità, non prevedibile prima dell'aggiudicazione dei lavori, di ripristinare o ricostruire ulteriori tratti di muretto a secco, oltre quelli previsti in progetto, poiché divelti dai cinghiali, con un conseguente importo in aumento del costo dei lavori pari a € 45.046,47, al lordo del ribasso d'asta;

3) *Riconducibili all'art. 132 c.3 del D. Lgs 163/2006.*

- In corso d'opera si è reso necessario disporre alcune modifiche finalizzate al miglioramento delle opere di spalcatura volte ad un più adeguato inserimento delle stesse, in considerazione dell'interferenza delle piante con le proprietà private e con i percorsi ciclabili , non prevedibili prima dell'aggiudicazione dei lavori, con un conseguente importo in aumento pari a € 1.753,50, al lordo del ribasso d'asta.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

ACCERTATA la non prevedibilità delle cause a motivo della variante al momento della stipula del contratto e della consegna dei lavori, e precisato che la variante è motivata per esclusive esigenze finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità e all'adeguamento delle normative sulla sicurezza;

DATO ATTO che dalla perizia di variante e di assestamento finale degli elaborati a corredo, a firma della D.L. si evince che le lavorazioni previste non erano prevedibili al momento della stipula del contratto e della consegna dei lavori; che sono tutte finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità nello esclusivo interesse dello Ente; che non comportano modifiche sostanziali al progetto originario; che non necessitano di alcuna autorizzazione aggiuntiva, che non necessitano di spesa aggiuntiva sullo stanziamento assegnato e che si prevede pertanto l'introduzione di n°18 nuovi prezzi per la definizione economica degli interventi necessari a risolvere le problematiche emerse durante il corso dei lavori:

N. P. 1 Fornitura e trasporto di pietrame per muri a secco € 22,25/mc;

N. P. 2 Fornitura e posa in opera di segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, dimensioni di 40 x 60 cm, € 33,95/cad.;

N. P. 3 Fornitura e posa in opera di segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I, in lamiera di alluminio spessore 25/10, lato 60 cm., rifrangenza classe II € 41,60/cad.;

N. P. 4 Fornitura e posa in opera di pannello integrativo di "distanza" (modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) integrato al segnale in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, dimensioni 20 x 60 cm € 25,10/cad.;

N. P. 5 Fornitura e posa in opera di segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II, lato 90 cm, € 58,30/cad.

N. P. 6 Fornitura e posa in opera di pannello integrativo di "distanza" (modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) integrato al segnale in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, dimensioni 30 x 90 cm, € 59,60/cad.;

N. P. 7 Fornitura e posa in opera di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione) in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di 90 x 120 cm, € 209,00/cad.;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- N. P. 8 Fornitura e posa in opera di Kit per segnaletica attiva, due luci, con sistema a lampeggio ad alimentazione fotovoltaica con pannello 20 W, € 1280,00/cad.;*
- N. P. 9 Fornitura e posa in opera di segnale di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione), a forma di freccia in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di 30 x 130 cm., € 90,20/cad.*
- N. P. 10 Fornitura e posa in opera di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione) in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di 90 x 120, € 209,00/cad.;*
- N. P. 11 Fornitura e posa in opera di segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di 40 x 60 cm., € 44,95/cad.*
- N. P. 12 Fornitura e posa in opera di pannello integrativo (modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) integrato al segnale, in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di 20 x 40 cm., € 19,40/cad.;*
- N. P. 13 Fornitura e posa in opera di segnale di conferma di itinerario in legno, di forma rettangolare delle dimensioni di 60 x 40 cm, compreso il palo in legno e le scritte ad incisione, € 152,03/cad.*
- N. P. 14 Fornitura e posa in opera di tabella interpretativa ed informativa, in lamiera di ferro 10/10, delle dimensioni 150 x 250 cm., € 775,00/cad.;*
- N. P. 15 Fornitura e posa in opera di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, diametro 60 cm, € 46,40 /cad.;*
- N. P. 16 Fornitura e posa in opera di Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in moplen, diametro 60 mm, € 57,80 cad.;*
- N. P. 17 Fornitura e posa in opera di pannelli integrativi di segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione), in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di 10 x 25 cm, € 8,85/cad.;*
- N. P. 18 Formazione di rallentatori ottici, come previsto dal C.d.S., con vernice rifrangente bianca, compreso ogni onere e magisterio per dare l'opera compiuta, € 3,87/mq;*



DATO ATTO del verbale di concordamento dei nuovi prezzi, allegato alla perizia di variante

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 161, comma 4, del D.P.R. 207/2010, L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite stabilito dal comma 12, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso;

DATO ATTO che l'approvazione della presente perizia rientra nei casi previsti dall'art. 161 c.9 del DPR 207/2010 a cui si farà fronte con l'utilizzo delle somme a disposizione dell'Amministrazione;

ATTESO che in data 20/09/2013 veniva redatta la perizia di variante e di assestamento finale predisposta dal Direttore dei Lavori costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica
- Quadro comparativo
- Schema atto di sottomissione

RILEVATO che la perizia di variante presenta il seguente Quadro Economico:

A. Importo complessivo dei Lavori

A.1 Importo dei lavori	€	224.855,61
<u>A.2 Importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza</u>	€	15.811,34
Sommano	€	240.666,94

B. Somme a disposizione della Stazione appaltante:

B.1 Imprevisti e lavori in economia 10% di A.1		
B.2 Incentivo di cui all'art. 92 DLGS 163/2006, 2%	€	5.338,58
B.3 Accantonamento di cui all'art. 133 c. 4 e 7 DLGS 163/2006		
B.4 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	€	24.558,00
B.5 CNAP 2% su B.4 + B.7	€	100,00
B.6 Spese per pubblicità, bandi, gare, e commissioni giudicatrici	€	1.920,00
B.7 Spese per collaudo tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi	€	2.500,00
B.8 IVA 10% su A	€	24.066,70
<u>B.9 IVA 22% su B.5 + B.7</u>	€	<u>572,00</u>
Sommano	€	<u>59.055,28</u>
<u>Totale al netto degli oneri della sicurezza</u>	€	<u>283.910,89</u>



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

arrotondamenti	€	68,55
TOTALE GENERALE	€	299.790,77

e che comporterà un aumento dell'importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta offerto pari al 25,41%, di € 25.753,38 oltre € 1.811,34 per oneri della sicurezza ed oltre IVA 10%, con un'incidenza del 12,93% circa sull'importo contrattuale dei lavori originario.

VISTO il D.lgs 163/2006 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 194 e 195 del D.P.R. 207/2010;

VISTO lo statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente che agli articoli 30 e 32 disciplina l'impegno e la liquidazione delle spese;

RICHIAMATI : C.I.G. n. 373255382B e C.U.P. n. f99b10000190002

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI APPROVARE la perizia di variante ed assestamento finale, di che trattasi, redatta dal D.L. dei lavori per un importo complessivo pari a € 299.790,77, così ripartito:

A. Importo complessivo dei Lavori

A.1 Importo dei lavori	€	224.855,61
<u>A.2 Importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza</u>	€	15.811,34
Sommano	€	240.666,94

B. Somme a disposizione della Stazione appaltante:

B.1 Imprevisti e lavori in economia 10% di A.1		
B.2 Incentivo di cui all'art. 92 DLGS 163/2006, 2%	€	5.338,58
B.3 Accantonamento di cui all'art. 133 c. 4 e 7 DLGS 163/2006		
B.4 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	€	24.558,00
B.5 CNAP 2% su B.4 + B.7	€	100,00
B.6 Spese per pubblicità, bandi, gare, e commissioni giudicatrici	€	1.920,00
B.7 Spese per collaudo tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi	€	2.500,00
B.8 IVA 10% su A	€	24.066,70



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

<u>B.9 IVA 22% su B4 + B.7</u>	€ 572,00
Sommano	€ 59.055,28
<u>Totale al netto degli oneri della sicurezza</u>	€ 283.910,89
arrotondamenti	€ 68,55
TOTALE GENERALE	€ 299.790,77

DI APPROVARE il verbale di concordamento nuovi prezzi , che sottoscritto dall'impresa, viene allegato come parte integrante e sostanziale della presente determinazione e costituisce accettazione per i lavori di cui alla perizia con stessi obblighi di cui al contratto originario.

DI APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione allegato come parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

DI DARE ATTO che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dei maggiori lavori sono previste e rivengono dall'assestamento del quadro economico del progetto approvato come rideterminato a seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori.

Il R. U. P.


Geom. Luigi Bombino

IL DIRETTORE F.F.


Fabio Modesti



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente ed all'Albo pretorio online dal 29/10/2013 e per 15 giorni consecutivi, fino al 12/11/2013.

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. ____ al capitolo _____ del bilancio di previsione anno _____ gestione residui/competenza.


Gravina, _____

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. ____ in data _____ sul capitolo _____ del bilancio di previsione anno _____ gestione residui/competenza.

Gravina, _____

L'incaricato

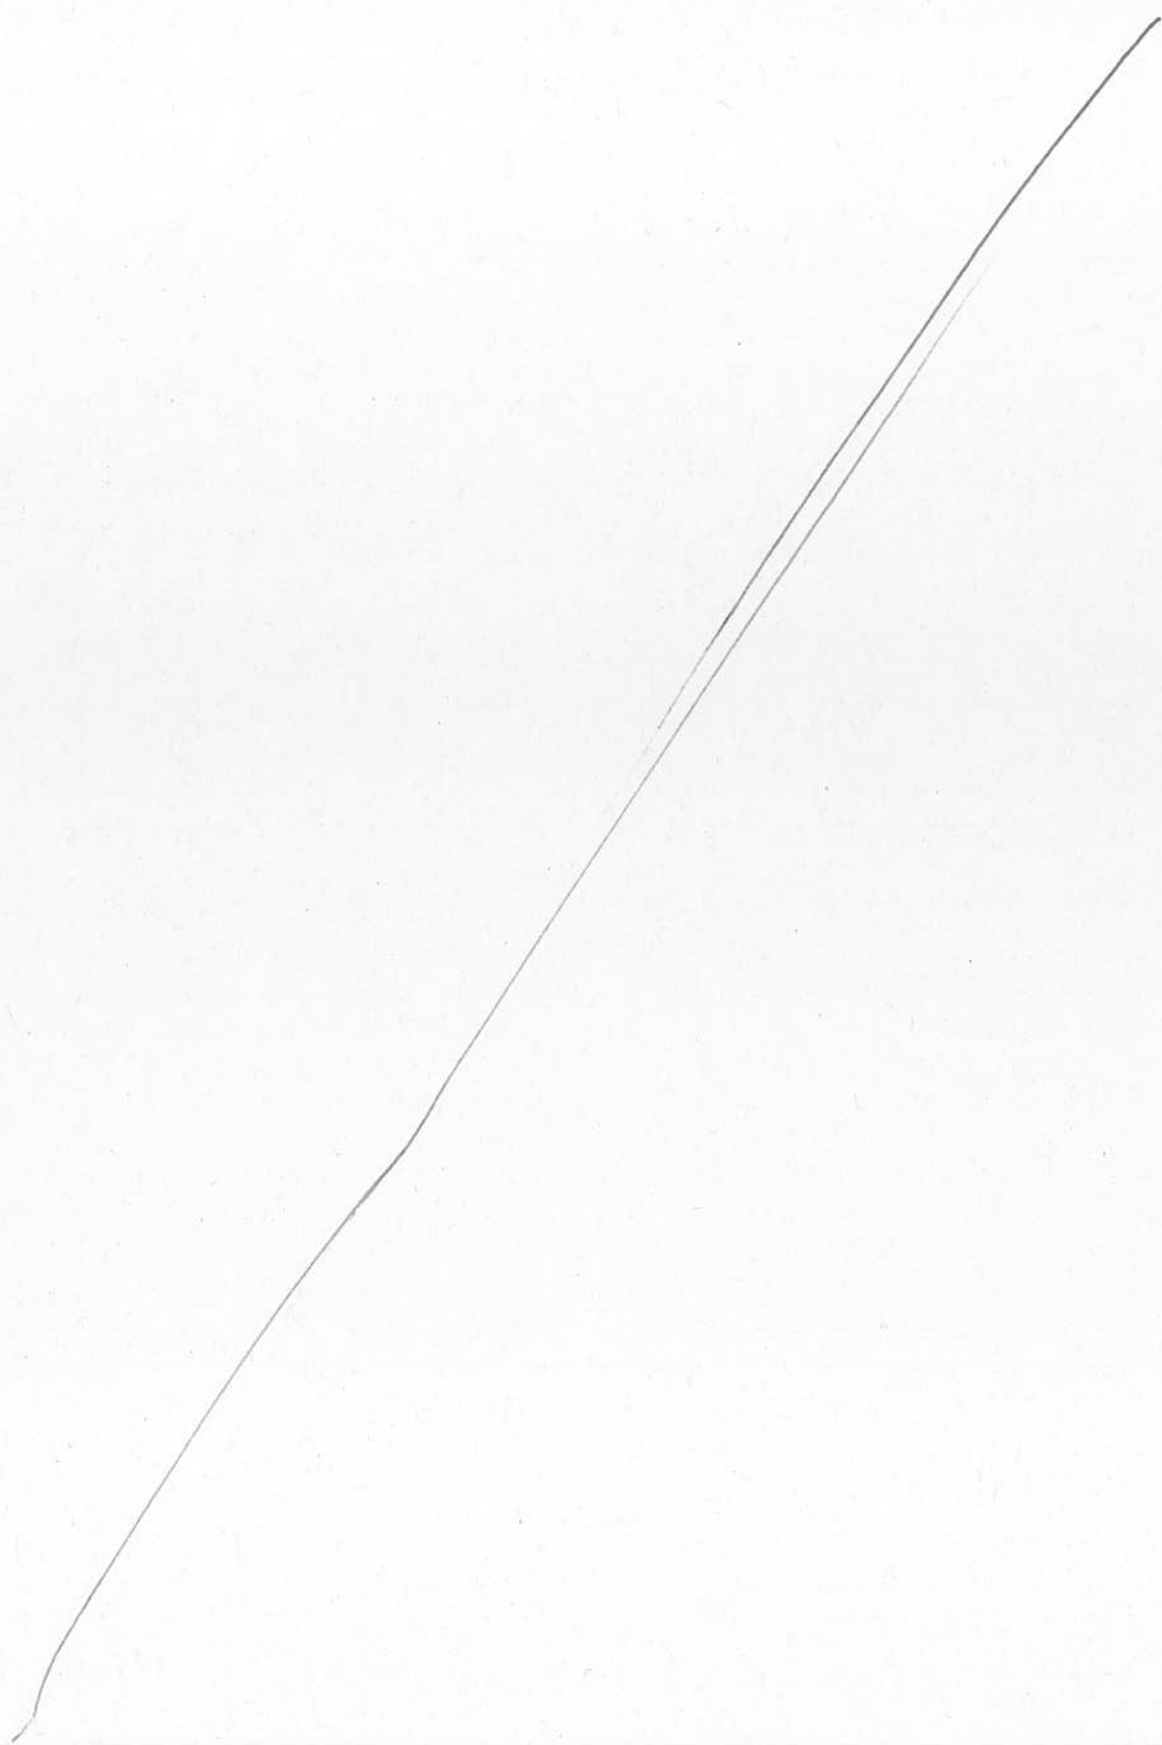

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA SUPPLETTIVA E DI ASSESTAMENTO FINALE

Lavori di : Allestimento dei percorsi ciclopedonali "Jazzo Rosso – San Magno – Castel del Monte
C.U.P. f99b1000019002 – C.I.G. 373255382B

Impresa : Raggruppamento Temporaneo d'Imprese CO.LE.FOR . s.n.c. (mandatario) e TRAFFIC
SERVICE s.r.l. (mandante)

Contratto in data in data 02/07/2012, registrato ad Altamura il 05/07/2012 al n° 6562 serie 3,

Importo contrattuale dei lavori euro 199.102,23, al netto del ribasso d'asta del 25,41%, oltre €
14.000,00 per oneri della Sicurezza.

RELAZIONE

A) Premessa

Il sottoscritto Geom. Luigi Bombino, in forza al Servizio tecnico dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia, per incarico ricevuto dal Direttore f. f., ha provveduto alla direzione dei lavori in epigrafe.

Il progetto esecutivo fu redatto nel febbraio 2010 dall'Arch. Mariagiovanna dell'Aglio, responsabile del servizio tecnico dell'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia ed approvato con determinazione del Direttore f. f. n° 274/2001 del 18/10/2011, prevedeva la seguente spesa:

A. Importo complessivo dei Lavori

A.1 Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	€	266.928,85
A.2 Importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza	€	14.000,00
Sommano	€	280.928,85



B. Somme a disposizione della Stazione appaltante:

B.1 Imprevisti	€	8.000,00
B.2 Incentivo di cui all'art. 92 DLGS 163/2006	€	5.618,58
B.3 Accantonamento di cui all'art. 133 c. 4 e 7 DLGS 163/2006	€	3.346,44
B.4 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordi- namento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	€	27.800,00
B.5 CNAP 2%	€	606,00
B.6 Eventuali spese per Commissioni giudicatrici	€	500,00
B.7 Spese per pubblicità, bandi e gare	€	3.039,32
B.8 Spese per collaudo tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi	€	2.000,00
B.8 IVA 21%	€	68.160,81
Sommano	€	119.071,15
Totale al netto degli oneri della sicurezza	€	386.000,00
TOTALE GENERALE	€	400.000,00



Le opere sono state finanziate per il 74,98% dalla Regione Puglia nell'ambito del Programma Operativo FESR Puglia 2007-2013 Asse IV Linea d'intervento 4.4 Attività "C", giusta determinazione del dirigente del Servizio Ecologia n. 469 del 20/10/201, e per il restante 25,02% dall'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia con impegno sul Cap. 11110.

A seguito dell'appalto pubblico espletato, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i lavori sono stati aggiudicati al R.T.I. in epigrafe, con il ribasso del 25,41% ed il quadro economico è stato, pertanto, rideterminato come si seguito :

A. Importo complessivo dei Lavori

A.1 Importo dei lavori al netto del ribasso del 25,41%	€	199.102,19
A.2 Importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza	€	14.000,00
Sommano	€	213.102,19

B) Somme a disposizione della Stazione appaltante:

B.1 Imprevisti e lavori in economia 10% di A.1	€	19.910,22
B.2 Incentivo di cui all'art. 92 DLGS 163/2006, 2%	€	5.338,58
B.4 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	€	27.800,00
B.5 CNAP 4% su B.4 + B.7	€	1.212,00
B.6 Spese per pubblicità, bandi, gare, e commissioni giudicatrici	€	2.000,00
B.7 Spese per collaudo tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi	€	2.500,00
B.8 IVA 10% su A	€	21.310,22
B.9 IVA 21% su B4 + B.5 + B.7	€	6.617,52
Sommano	€	86.688,54
Totale al netto degli oneri della sicurezza	€	285.790,73
TOTALE GENERALE	€	299.790,73

L'importo contrattuale, quindi, dedotto il ribasso del 25,41 %, è risultato pari a euro 199.102,19, oltre euro 14.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

Come da Contratto l'impresa ha prestato cauzione definitiva di euro 31.956,36 con atto di fidejussione n. 06/01/21/2478233 stipulato con la "Finanziaria Romana", ridotta, ex art. 75 c. 7 del D.Lgs 163/2006, essendo, entrambe le imprese costituenti il R.T.I., in possesso della certificazione di qualità ISO 9011.

I lavori sono stati consegnati definitivamente il giorno 05/07/2012 come da verbale in pari data ed hanno avuto effettivo inizio in data 09/07/2012.

La durata prevista dal Contratto è di sessanta giorni lavorativi e consecutivi , con scadenza pertanto al 27/09/2012.

Durante l'esecuzione dei lavori l'impresa ha richiesto una proroga di giorni 40, che l'amministrazione appaltante ha concesso nella misura richiesta, con nuova scadenza al 23/11/2012. Per effetto della presente perizia, al fine di adeguare il progetto alle prescrizioni dettate dalla Provincia di Bari, Servizio Territorio e Viabilità e dal Comando VV. UU. del Comune di Ruvo di Puglia é stata ordinata dalla direzione lavori, come risulta da apposito verbale, la sospensione

parziale dei lavori limitatamente alle opere di fornitura e posa in opera della segnaletica stradale verticale, a far data dal 03/10/2012, per consentire una variante finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità consistente nel ridimensionamento e nella rimodulazione della segnaletica verticale in metallo, oltre che nella sistemazione e nella ricostruzione di ulteriori tratti di muretti a secco.

In data 26/06/2013, ottenuti gli assensi delle Amministrazioni predette è stata ordinata, dalla direzione lavori, la ripresa. Per effetto della sospensione parziale predetta il termine di consegna dei lavori è stato prorogato di ulteriori 105 giorni lavorativi, calcolati ai sensi dell'art. 159 c. 7 del DPR 207/2010, con nuova scadenza quindi al 22/11/2013.

B) Cause di variante

In corso d'opera si è manifestata la necessità di eseguire maggiori lavori per le seguenti motivazioni:

1) Riconducibili all'art. 132 c.1, lett. b) del D. Lgs 163/2006 :

- Dopo l'approvazione del progetto esecutivo la Provincia di Bari, Servizio Viabilità, ed i Comandi della Polizia Locale dei Comuni di Corato e Ruvo di Puglia, hanno chiesto di apportare modifiche alla tipologia ed alla quantità della segnaletica verticale da apporre lungo le strade di loro gestione, al fine di risolvere interferenze con i propri piani " del traffico", con una conseguente costo in diminuzione dei lavori di € 18.683,74.

2) Riconducibili all'art. 132 c.1, lett. c) del D. Lgs 163/2006 :

- In corso d'opera si è rilevata la necessità, non prevedibile prima dell'aggiudicazione dei lavori, di ripristinare o ricostruire ulteriori tratti di muretto a secco, oltre quelli previsti in progetto, poiché divelti dai cinghiali, con un conseguente importo in aumento del costo dei lavori pari a € 45.046,47.

3) Riconducibili all'art. 132 c.3 del D. Lgs 163/2006.

- In corso d'opera si è reso necessario disporre alcune modifiche finalizzate al miglioramento delle opere di spalcatura volte ad un più adeguato inserimento delle stesse, in considerazione dell'interferenza delle piante con le proprietà private e con i percorsi ciclabili, non prevedibili prima dell'aggiudicazione dei lavori, con un conseguente importo in aumento pari a € 1.753,50.

E' stata pertanto redatta la presente variante in corso d'opera, con aumento di spesa, finalizzata al miglioramento dell'opera con l'introduzione di alcuni nuovi prezzi, le cui lavorazioni sono indicate nei vari elaborati, ai sensi dell' art. 132, D.Lgs. 163/2006, comma 1, lett. b) e c) e comma 3, secondo periodo.

Si prevede pertanto l'introduzione di n° 18 nuovi prezzi a misura per la definizione economica degli interventi necessari a risolvere le problematiche emerse durante il corso dei lavori, e quantificate negli elaborati.

I nuovi prezzi per la stima delle opere modificate con la presente Variante sono i seguenti:

N. P. 1 Fornitura e trasporto di pietrame per muri a secco € 22,25/mc;

N. P. 2 Fornitura e posa in opera di segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, dimensioni di 40 x 60 cm, € 33,95/cad.;

N. P. 3 Fornitura e posa in opera di segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I, in lamiera di alluminio spessore 25/10, lato 60 cm., rifrangenza classe II € 41,60/cad.;

N. P. 4 Fornitura e posa in opera di pannello integrativo di "distanza" (modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) integrato al segnale in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, dimensioni 20 x 60 cm € 25,10/cad.;

N. P. 5 Fornitura e posa in opera di segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II, lato 90 cm, € 58,30/cad.

N. P. 6 Fornitura e posa in opera di pannello integrativo di "distanza" (modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) integrato al segnale in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, dimensioni 30 x 90 cm, € 59,60/cad.;

N. P. 7 Fornitura e posa in opera di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione) in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di 90 x 120 cm, € 209,00/cad.;

N. P. 8 Fornitura e posa in opera di Kit per segnaletica attiva, due luci, con sistema a lampeggio ad alimentazione fotovoltaica con pannello 20 W, € 1280,00/cad.;

N. P. 9 Fornitura e posa in opera di segnale di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione), a forma di freccia in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di 30 x 130 cm., € 90,20/cad.

N. P. 10 Fornitura e posa in opera di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione) in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di 90 x 120, € 209,00/cad.;

N. P. 11 Fornitura e posa in opera di segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di 40 x 60 cm., € 44,95/cad.

N. P. 12 Fornitura e posa in opera di pannello integrativo (modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) integrato al segnale, in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di 20 x 40 cm., € 19,40/cad.;

N. P. 13 Fornitura e posa in opera di segnale di conferma di itinerario in legno, di forma rettangolare delle dimensioni di 60 x 40 cm, compreso il palo in legno e le scritte ad incisione, € 152,03/cad.

N. P. 14 Fornitura e posa in opera di tabella interpretativa ed informativa, in lamiera di ferro 10/10, delle dimensioni 150 x 250 cm., € 775,00/cad.;

N. P. 15 Fornitura e posa in opera di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, diametro 60 cm, € 46,40 /cad.;

N. P. 16 Fornitura e posa in opera di Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in moplen, diametro 60 mm, € 57,80 cad.;

N. P. 17 Fornitura e posa in opera di pannelli integrativi di segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione), in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di 10 x 25 cm, € 8,85/cad.;

N. P. 18 Formazione di rallentatori ottici, come previsto dal C.d.S., con vernice rifrangente bianca, compreso ogni onere e magisterio per dare l'opera compiuta, € 3,87/mq;

Pertanto l'importo dei lavori varierà in relazione al nuovo quadro economico:

A. Importo complessivo dei Lavori

A.1 Importo dei lavori	€	224.855,61
<u>A.2 Importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza</u>	€	15.811,34
Sommano	€	240.666,94

B. Somme a disposizione della Stazione appaltante:

B.1 Imprevisti e lavori in economia 10% di A.1		
B.2 Incentivo di cui all'art. 92 DLGS 163/2006, 2%	€	5.338,58
B.3 Accantonamento di cui all'art. 133 c. 4 e 7 DLGS 163/2006		
B.4 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	€	24.558,00
B.5 CNAP 2% su B.4 + B.7	€	100,00
B.6 Spese per pubblicità, bandi, gare, e commissioni giudicatrici	€	1.920,00
B.7 Spese per collaudo tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi	€	2.500,00
B.8 IVA 10% su A	€	24.066,70
<u>B.9 IVA 21% su B4 + B.5 + B.7</u>	€	<u>572,00</u>
Sommano	€	59.055,28
<u>Totale al netto degli oneri della sicurezza</u>	€	<u>283.910,89</u>
arrotondamenti	€	68,55
TOTALE GENERALE	€	299.790,77

e comporterà un aumento dell'importo dei lavori di € 25.753,38 oltre € 1.811,34 per oneri della sicurezza ed IVA 10%, con un'incidenza del 12,93% circa sull'importo contrattuale originario pari a 199.102,23 oltre € 14.000,00 per oneri della sicurezza ed IVA 10%.

Pertanto il nuovo importo contrattuale ammonterebbe a € 240.666,94 oltre € 15.811,34 per oneri della sicurezza ed IVA 10%.

L'importo in aumento verrà coperto con l'utilizzo dell'economie rivenienti dall'assestamento a del Quadro Economico rideterminato.


Allegati :

- 1) Quadro Comparativo;
- 2) Verbale Concordamento Nuovi Prezzi

3) Schema di atto di sottomissione


Gravina in Puglia, 20/09/2013

Il Direttore dei Lavori
Geom. Luigi Bombino



Visto il Progettista
Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio

Visto il R. U. P.
Geom. Luigi Bombino



L'Impresa :

CO.LE.FOR. s.n.c.
di Puzifferri & Squeo
Via Don G. Colanigelo, 9
70024 Gravina (BA) - Tel. 0803268537
Part. IVA e C. F. 05079570726

VERBALE DI CONCORDAMENTO DEI NUOVI PREZZI

Lavori di : Allestimento dei percorsi ciclopedonali "Jazzo Rosso – San Magno – Castel del Monte.

C.U.P. f99b1000019002 – C.I.G. 373255382B

Impresa : Raggruppamento Temporaneo d'Imprese CO.LE.FOR . s.n.c. (mandatario) e TRAFFIC SERVICE s.r.l. (mandante)

Contratto in data in data 02/07/2012, registrato ad Altamura il 05/07/2012 al n° 6562 serie 3,

Importo contrattuale dei lavori euro 199.102,23, al netto del ribasso d'asta del 25,41%, oltre € 14.000,00 per oneri della Sicurezza ed IVA 10%.

L'anno duemilatredici il giorno ventitre del mese di settembre in Gravina in Puglia nella sede dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia, alla via Firenze 10,

Premesso:

– che con contratto d'appalto indicato a margine sono stati affidati i lavori in oggetto all'impresa R.T.I. CO.LE.FOR. s.n.c. e TRAFFIC CENTER s.r.l. per l'importo netto di Euro 109.102,23 oltre € 14.000,00 per oneri della sicurezza ed IVA 10%;

– che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune categorie di lavori non previsti nel contratto di appalto, sicché per la loro esecuzione e relativa contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari.

Tra il Geom. Luigi Bombino, direttore dei lavori indicati in oggetto ed il sig Mauro Squeo in qualità di legale rappresentante del R.T.I. affidataria, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi unitari i quali saranno soggetti allo stesso ribasso d'asta previsto in contratto:

N. P. 1 *Fornitura e trasporto di pietrame per muri a secco € 22,25/mc (euro ventidue virgola 25 a metro cubo)*

N. P. 2 *Fornitura e posa in opera di segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, dimensioni di 40 x 60 cm, € 33,95/cad. (euro trentatre virgola novantacinque cadauno);*

N. P. 3 *Fornitura e posa in opera di segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I, in lamiera di alluminio spessore 25/10, lato 60 cm., rifrangenza classe II € 41,60/cad. (euro quarantuno virgola sessanta cadauno);*

N. P. 4 Fornitura e posa in opera di pannello integrativo di "distanza" (modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) integrato al segnale in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, dimensioni 20 x 60 cm € 25,10/cad. (euro venticinque virgola dieci cadauno);

N. P. 5 Fornitura e posa in opera di segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II, lato 90 cm, € 58,30/cad. (euro cinquantotto virgola trenta cadauno);

N. P. 6 Fornitura e posa in opera di pannello integrativo di "distanza" (modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) integrato al segnale in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, dimensioni 30 x 90 cm, € 59,60/cad. (euro cinquantanove virgola sessanta cadauno);

N. P. 7 Fornitura e posa in opera di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione) in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di 90 x 120 cm, € 209,00/cad. (euro duecentonove cadauno);

N. P. 8 Fornitura e posa in opera di Kit per segnaletica attiva, due luci, con sistema a lampeggio ad alimentazione fotovoltaica con pannello 20 W, € 1.280,00/cad. (euro milleduecentottanta cadauno);

N. P. 9 Fornitura e posa in opera di segnale di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione), a forma di freccia in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di 30 x 130 cm., € 90,20/cad. (euro novanta virgola venti cadauno);

N. P. 10 Fornitura e posa in opera di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione) in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di 90 x 120, € 209,00/cad. (euro duecentonove cadauno);

N. P. 11 Fornitura e posa in opera di segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di 40 x 60 cm., € 44,95/cad. (euro quarantaquattro virgola novantacinque cadauno);

N. P. 12 Fornitura e posa in opera di pannello integrativo (modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) integrato al segnale, in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di 20 x 40 cm., € 19,40/cad. (euro diciannove virgola quaranta cadauno);

N. P. 13 Fornitura e posa in opera di segnale di conferma di itinerario in legno, di forma rettangolare delle dimensioni di 60 x 40 cm, compreso il palo in legno e le scritte ad incisione, € 152,03/cad. (euro centocinquantadue virgola zero tre cadauno);

N. P. 14 Fornitura e posa in opera di tabella interpretativa ed informativa, in lamiera di ferro 10/10, delle dimensioni 150 x 250 cm., € 775,00/cad. (euro settecentosettantacinque cadauno);

N. P. 15 Fornitura e posa in opera di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, diametro 60 cm, € 46,40 /cad. (euro quarantasei virgola quaranta cadauno);

N. P. 16 Fornitura e posa in opera di Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in moplen, diametro 60 mm, € 57,80 cad. (euro cinquantasette virgola ottanta cadauno);

N. P. 17 Fornitura e posa in opera di pannelli integrativi di segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione), in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di 10 x 25 cm, € 8,85/cad. (euro otto virgola ottantacinque cadauno);

N. P. 18 Formazione di rallentatori ottici, come previsto dal C.d.S., con vernice rifrangente bianca, compreso ogni onere e magisterio per dare l'opera compiuta, € 3,87/mq (euro tre virgola ottantasette a metro quadrato).

Agli effetti fiscali si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale muta l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto indicato a margine.

Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice dei lavori, mentre per l'amministrazione appaltante lo diverrà dopo l'intervenuta approvazione dei superiori organi di controllo.


Letto e confermato e sottoscritto

L'Impresa

COLE.FOR. s.n.c.
di Puzziferrì & Squeo
Via Don G. Colangelo, 9
70022 Brevig. (BANT) 0803268537
Part. IVA e C. F. 03879570726

Il Direttore dei Lavori
Geom. Luigi Bombino

Visto: Il Responsabile del Procedimento
Geom. Luigi Bombino

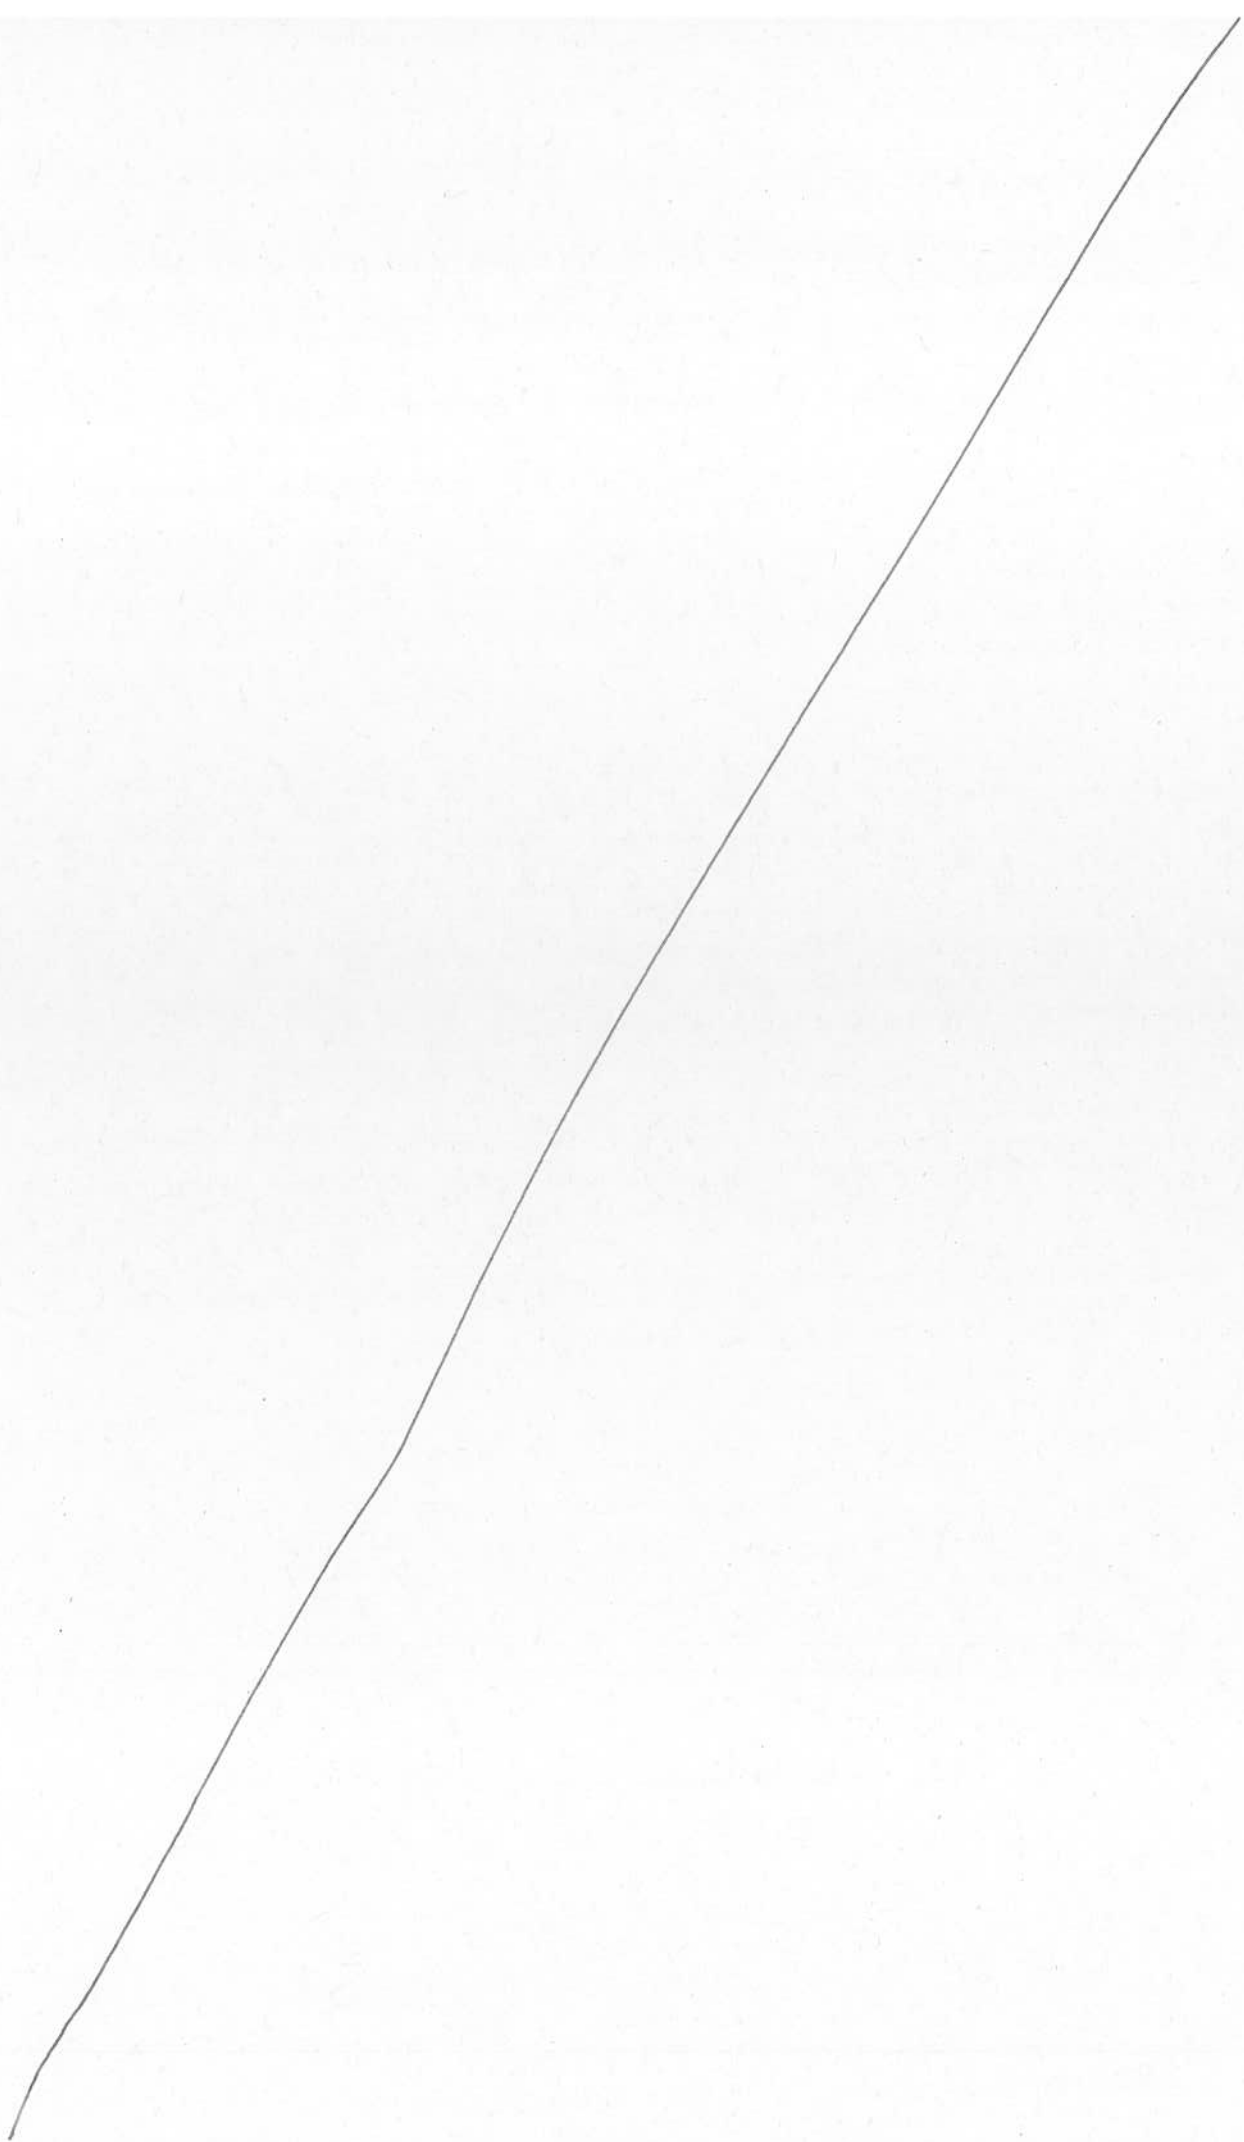

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art. 163 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

APPALTO LAVORI DI : Allestimento dei percorsi ciclopedonali

"Jazzo Rosso – San Magno – Castel del Monte.

C.U.P. f99b1000019002 – C.I.G. 373255382B

IMPRESA APPALTATRICE : Raggruppamento Temporaneo
d'Imprese CO.LE.FOR . s.n.c. (mandatario) e TRAFFIC SERVICE
s.r.l. (mandante).

CONTRATTO in data in data 02/07/2012, registrato ad Altamura il
05/07/2012 al n° 6562 serie 3,.

L'anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di ottobre con il
presente atto, tra ;

- Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia con sede in Gravina in Puglia
alla via Firenze, 10, C.F./ P. IVA 06339200724, rappresentato dal
Direttore f.f. Fabio Modesti nato a Bari il 30/03/1962, per la carica
domiciliato presso la sede dell'Ente; e

- Raggruppamento Temporaneo d'Imprese CO.LE.FOR . s.n.c.
(mandatario) C.F. 05079570726 corrente in Gravina in Puglia alla via
Don Giovanni Colangelo, 9 e TRAFFIC SERVICE s.r.l., corrente in
Spinazzola alla Via G. Bovio, 17, C.F. 06189600726, raggruppamento
costituitosi con atto a rogito notaio Domenico Digiesi di Gravina del
22/06/2012, Rep. N. 63417, rappresentato dal sig. Squeo Mauro nato
a Gravina il 08/07/1964, cui sono stati conferiti i poteri di sottoscrivere
il presente atto,

Premesso:

- che con contratto in data 02/07/2012, registrato ad Altamura il 05/07/2012 al n° 6562 serie 3, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese CO.LE.FOR . s.n.c. (mandatario) e TRAFFIC SERVICE s.r.l. (mandante) ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di €199.102,23 oltre € 14.000,00 per oneri della sicurezza ed IVA 10%;

- con riferimento al progetto in questione è stata redatta una perizia suppletiva e di variante da parte del Direttore dei Lavori Geom. Luigi Bombino, finalizzata al miglioramento dell'opera con l'introduzione di alcuni nuovi prezzi, essendosi manifestata in corso d'opera la necessità di eseguire maggiori lavori per le seguenti motivazioni:

1) Riconducibili all'art. 132 c.1, lett. b) del D. Lgs 163/2006 :

- Dopo l'approvazione del progetto esecutivo la Provincia di Bari, Servizio Viabilità, ed i Comandi della Polizia Locale dei Comuni di Corato e Ruvo di Puglia, hanno chiesto di apportare modifiche alla tipologia ed alla quantità della segnaletica verticale da apporre lungo le strade di loro gestione, al fine di risolvere interferenze con i propri piani " del traffico", con una conseguente costo in diminuzione dei lavori di € 18.683,74.

2) Riconducibili all'art. 132 c.1, lett. c) del D. Lgs 163/2006 :

- In corso d'opera si è rilevata la necessità, non prevedibile prima dell'aggiudicazione dei lavori, di ripristinare o ricostruire ulteriori tratti di muretto a secco, oltre quelli previsti in progetto, poiché divelti dai cinghiali, con un conseguente importo in aumento del costo dei lavori

pari a € 45.046,47.

3) Riconducibili all'art. 132 c.3 del D. Lgs 163/2006.

- In corso d'opera si è reso necessario disporre alcune modifiche finalizzate al miglioramento delle opere di spalcatura volte ad un più adeguato inserimento delle stesse, in considerazione dell'interferenza delle piante con le proprietà private e con i percorsi ciclabili, non prevedibili prima dell'aggiudicazione dei lavori, con un conseguente importo in aumento pari a € 1.753,50.

- che la perizia di variante è stata approvata con determinazione del Direttore f.f. dell'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia n. 295/2013 del 07/10/2013.

Tutto ciò premesso, considerato che i termini contrattuali che legarono la Amministrazione Appaltante e l'Impresa Appaltatrice vengono variati con la seguente scrittura, si stipula e si conviene :

Art. 1 - OGGETTO - L' Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia affida alla Ditta qui rappresentata, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione di ulteriori lavori per l'intervento di Allestimento dei percorsi ciclopedonali "Jazzo Rosso - San Magno - Castel del Monte, così come descritti nella perizia di variante, che qui si intende integralmente richiamata, approvata con determinazione del Direttore f.f. n. 295/2013 del 07/10/2013.

Art. 2 - CORRISPETTIVO - L'importo dei lavori complementari da eseguire ammonta complessivamente a €. 25.773,38 (diconsi euro venticinquemilasettecentosettantatre virgola trentotto), al netto del ribasso d'asta già offerto in sede di gara pari al 25,41%, che compresi

gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) pari a € 1.811,34 (euro milleottocentoundici virgola trentaquattro) determina un corrispettivo spettante all'Impresa Appaltante per Lavori complementari pari a €. 27.564,71 (euro ventisettemila cinquecento sessantaquattro virgola settantuno) oltre I.V.A. 10% e quindi per un totale complessivo di €. 30.321,18 (diconsi euro trentamilatrecentoventuno virgola diciotto).

Art. 3 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - Ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti di cui la presente contratto aggiuntivo, dovranno avvenire esclusivamente a mezzo di bonifico su conti correnti dedicati accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A. Tali clausole dovranno essere inserite anche nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori.

Art. 4 - PREZZI - Per l'esecuzione dei nuovi lavori è stato sottoscritto in data 23 settembre 2013 il Verbale di concordamento nuovi prezzi in base al quale saranno contabilizzati i lavori.

Art. 5 - REGISTRAZIONE - ONERI FISCALI - Sono carico all'Impresa tutti gli oneri fiscali conseguenti al presente atto, ivi incluse le spese di bollo e registrazione.

Art. 6 - TERMINE DI ULTIMAZIONE - Per l'esecuzione delle maggiori lavorazioni sono attribuiti alla ditta ulteriori 105 giorni (centocinque giorni) rispetto al contratto principale ed alla proroga concessa.

Art. 7 - ALTRE CLAUSOLE - Per tutte le altre clausole e condizioni, sono confermate quelle del contratto principale.

ART 8 - VALORE FISCALE DEL CONTRATTO - REGISTRAZIONE -

Le parti dichiarano ad ogni fine di legge che il presente atto ha un valore di € 27.564,71 (euro ventisettemila cinquecento sessantaquattro virgola settantuno).

Il contratto è soggetto ad I.V.A., per cui è applicabile l'imposta in misura fissa a mente dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

ART 9 - SPESE CONTRATTUALI - Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145, sono a completo carico della ditta appaltatrice tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto per bolli, diritti di segreteria e imposta di registro, nessuna esclusa.

È a carico del Ente la spesa per l'I.V.A..

L'APPALTATORE

IL DIRETTORE F.F.

